



Челябинская область

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок»

**Презентация проекта по внедрению
бережливых технологий в системе образования
Челябинской области**

**Тема проекта
«Оптимизация процесса публикации
информационных материалов об образовательных
событиях МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 5 «Малышок» в сети «Интернет»**

Заведующая МКДОУ № 5 «Малышок»
Копейкина И.Н.

Нязепетровск-2025г.



Челябинская область



Карточка проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок» и сети Интернет»

Заместитель Главы Нязепетровского
муниципального округа

 / Н.В. Ахисева/

Начальник Управления образования администрации
Нязепетровского муниципального округа

 / Д.А. Галанов/

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Копейкина Ирина Николаевна заведующая МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малышок»

Владелец процесса: Копейкина Ирина Николаевна заведующая МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малышок»

Периметр проекта: кабинет заведующей МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок»

Границы процесса: с момента поступления поручения о необходимости размещения информации об образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок» в сети Интернет до получения обратной связи об исполнении поручения

Руководитель проекта: Лаврентьева Галина Петровна - воспитатель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малышок»

Команда проекта: Сухарева Елена Николаевна - воспитатель, Сычева Мария Ивановна – воспитатель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение статьи 44 п. 3 пп.4 ФЗ закона 273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения прав родителей (законных представителей) на ознакомление с содержанием, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей.

Последствия: потеря актуальности размещаемых информационных материалов об образовательных событиях на сайте, в сетевом сообщество ДОУ ведет к несвоевременному включению родителей в образовательный процесс, к снижению качества образовательных услуг, неудовлетворенности родителей (законных представителей), снижению имиджа ДОУ.

Причина возникновения: отсутствие стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательной деятельности в сети Интернет

Ценность для заказчика: своевременное и актуальное опубликование информации об образовательных событиях на сайте, в сообществе будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса, повышению уровня усвоения программного материала воспитанниками, повышению качества образования, удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг и повышению имиджа ДОУ.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса публикации информационных материалов об образовательной деятельности в сети Интернет	120 мин*	уменьшение в 4 раза
Стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательной деятельности в сети Интернет	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 03.02.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса
разработка карты текущего состояния процесса – 04.02.2025 - 07.02.2025
анализ и оценка текущего состояния процесса – 10.02.2025 - 14.02.2025
разработка карты целевого состояния процесса – 17.02.2025 - 21.02.2025
разработка плана реализации проекта – 24.02.2025 - 27.02.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.02.2025
4. Внедрение улучшений – 03.03.2025 -14.03.03.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 17.03.2025 - 21.03.2025
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 24.03.2025 – 28.03.2025

Согласовано: Руководитель проектного офиса УО
Нязепетровского муниципального округа
/ Д.А. Галанов/





Челябинская область

Карта **текущего** состояния процесса

«Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок» в сети «Интернет»



Время протекания процесса –
120 мин.

ВХОД

1. Временные затраты на лишние перемещения в ходе дачи поручения педагогам
2. Перепроизводство (избыточность) предоставляемой информации, разностилевое ее оформление
3. Временные затраты на переделку предоставляемой информации
4. Временные затраты на ожидание информации от педагогов
5. Большие временные затраты на публикацию информации на сайте и социальных сетях




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения	Экономия времени
1.Временные затраты на лишние перемещения в ходе поручения педагогам	Отсутствие плана-графика	Передача материалов по электронным формам связи	35-15 мин.
2.Избыточность информации	В сети «Интернет» много данных, и необходимо найти те из них, которые наиболее полезны».	Разработка образца и алгоритма для новостей различного содержания	10-5мин.
3.Длительное время загрузки файлов	Большие и сложные файлы требуют больше времени для загрузки	Разработать алгоритм Для ускорения загрузки сайта	30-15мин.
4.Разностилевое оформление текстовой информации	Отсутствие структуры текста. Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов.	Для решения проблемы необходимо повысить компетентность педагогов в оформлении текстовой информации	30-20 мин.
5.Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах ДОУ	Создание стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет	Передача материалов по электронным формам связи	15-10 мин.



Пирамида проблем

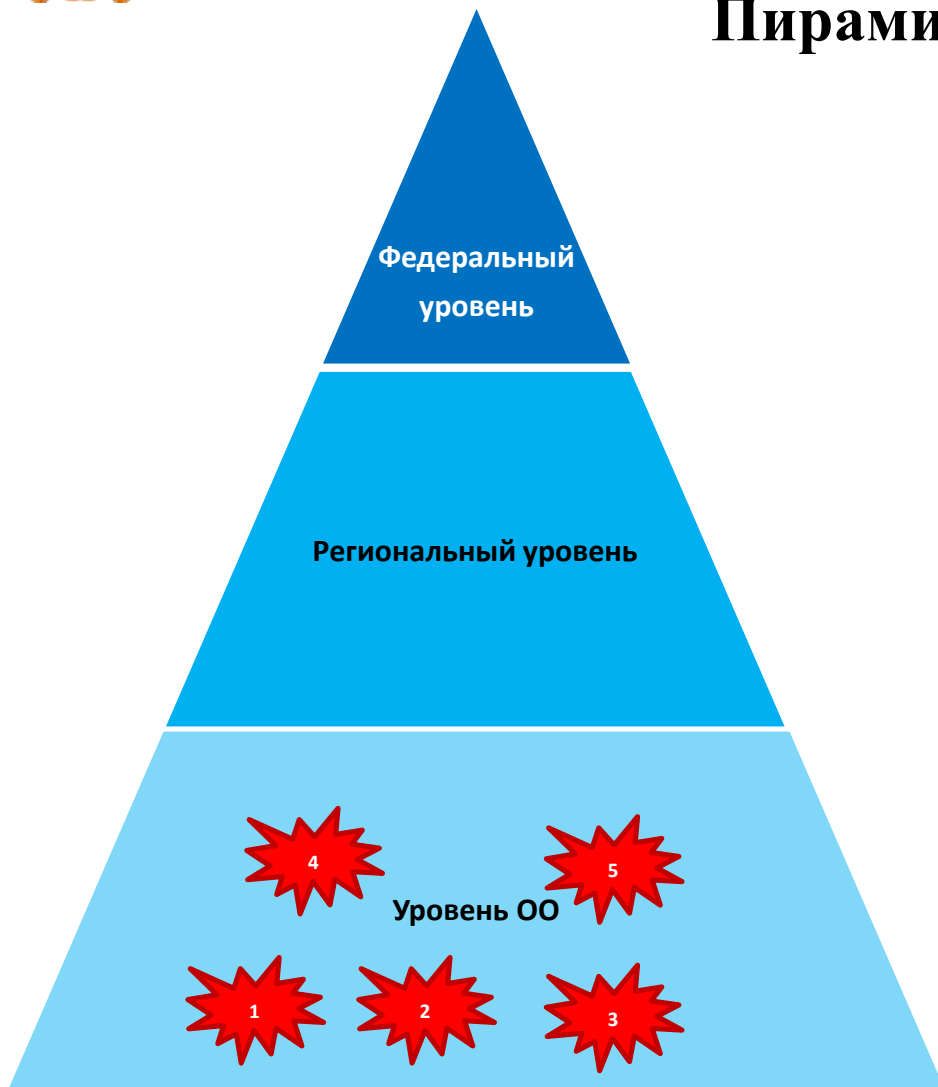

Проблемы, решение которых
требуется на федеральном уровне

Проблемы, решение которых
требуется на региональном уровне

- 1.1. Временные затраты на лишние перемещения в ходе дачи поручения педагогам
2. Перепроизводство (избыточность) предоставляемой информации, разностилевое ее оформление
3. Временные затраты на переделку предоставляемой информации
4. Временные затраты на ожидание информации от педагогов
5. Большие временные затраты на публикацию информации на сайте и социальных сетях



Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях»

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок» в сети «Интернет»



Предложения по улучшению

1. Разработка и утверждение плана-графика информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»
2. Согласование канала передачи информации по электронным средствам связи.
3. Разработка информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»
4. Создание стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»

Время протекания процесса – 30 мин.



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок
1. Длительный процесс подготовки информации	Передача материалов по электронным формам связи	Педагоги	03.02.2025
2. Предоставление информации на разных носителях	Алгоритм подготовки информации для размещения на сайт	Педагоги	03.02.2025
3. Избыточность информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей	Педагоги	03.02.2025
4. Отсутствие ограничения на количество и размер фотографии для размещения	Требования к количеству, размеру и качеству фотографий	Педагоги	03.02.2025
5. Временные потери при загрузке файлов с большим объемом	Шаблон для размещения информации на сайте	Педагоги	03.02.2025



Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок
6. Длительное время загрузки нескольких изображений с большим объемом	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере	Педагоги	03.02.2025
7. Рзностилевое оформление информации	Разработка шаблона для размещения информации на сайте	Педагоги	03.02.2025
8. Отсутствие ответственного за организацию процесса	Разработка циклограммы ответственного за сайт	Педагог ответственный за сайт	14.03.2025



Результаты реализации проекта

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический показатель
Время протекания процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»	120 мин.	уменьшение в 4 раза	30 мин.
Стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»	отсутствие	наличие	наличие



Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

120 минут

СТАЛО:

30 минут

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:

90–единицы измерения 75%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

Стандартизация и визуализация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок»



Выполнение плана реализации проекта

1. Разработанный стандарт используется педагогическими работниками в процессе публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет», что позволило сократить временные затраты в 4 раза.

2. Результатом реализации проекта является своевременное и актуальное опубликование информации об образовательных событиях на сайте, в сообществе, повышение эффективности образовательного процесса, повышение уровня усвоения программного материала воспитанниками, повышение качества образования, удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг, повышение имиджа ДОУ.

3. Материальные затраты на реализацию проекта отсутствуют.



Результаты реализации проекта

1. Вся информация передается по электронным формам связи

2. Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)

3. Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений

4. Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля



Челябинская область


Было:



Обея (стенд)



Стало:

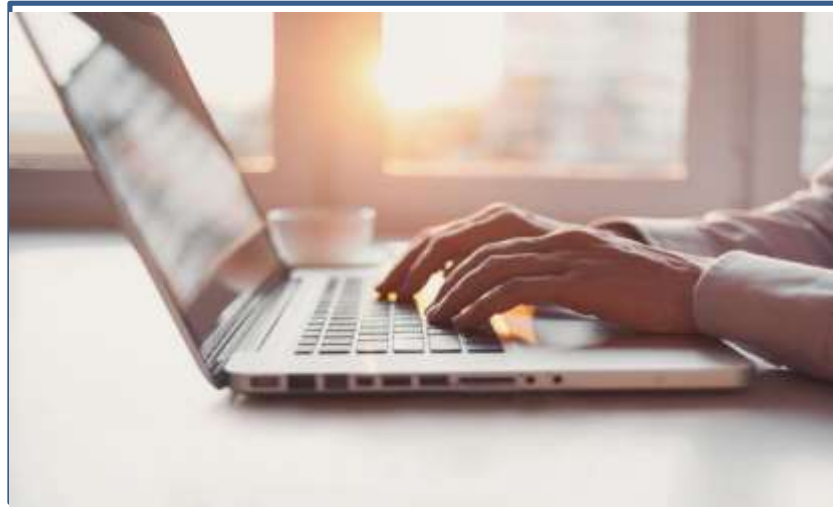

Работа над картой текущего или целевого состояния





Стандарт процесса

публикации информационных материалов об образовательных событиях МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида №5 «Малышок» в сети «Интернет».



Решение организационных
вопросов



Передача материалов



Проверка текста к
публикации



Размещение информации на
сайте и в социальных
сетях

